

5 maggio 2025

## Avviso alle residenti e ai residenti

Gentili Signore, Egregi Signori,

vi informiamo che prenderà avvio il seguente cantiere stradale:

Dove	<b>nel quartiere di Mendrisio, in via della Selva.</b>
Quando	<b>da lunedì 19 maggio 2025, per una durata indicativa di 12 mesi.</b>
Lavori	<b>sostituzione della canalizzazione, di altre infrastrutture e pavimentazione.</b>
Direzione lavori	<b>Fabio Bianchi &amp; Associati SA</b>
Progetto	<b>Aziende Industriali Mendrisio (AIM)</b>

Per ridurre al minimo i disagi, i lavori saranno eseguiti a fasi con conduzione del traffico alternata tramite impianto semaforico e gli accessi pedonali saranno sempre garantiti. L'accesso veicolare alle proprietà private sarà sempre garantito (dettagli vedi QR). Eventuali condizioni meteorologiche avverse o imprevisti tecnici potrebbero modificare i tempi di esecuzione, anche con breve preavviso.

L'avvio, i dettagli e gli aggiornamenti del cantiere saranno pubblicati sul portale ufficiale della Città di Mendrisio [www.mendrisio.ch/cantieri](http://www.mendrisio.ch/cantieri).

Il **codice QR** qui a fianco vi offre una panoramica del progetto.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare la direzione dei lavori, ing. Fabio Vanini al numero +41 79 512 85 82.

Info progetto





Le AIM ringraziano sin d'ora per la comprensione, la collaborazione e il rispetto della segnaletica provvisoria e delle indicazioni fornite dalle persone responsabili del cantiere.

### Per le Aziende Industriali Mendrisio

Gianpaolo Pontarolo  
Direttore AIM

Antonio Cennerazzo  
Responsabile

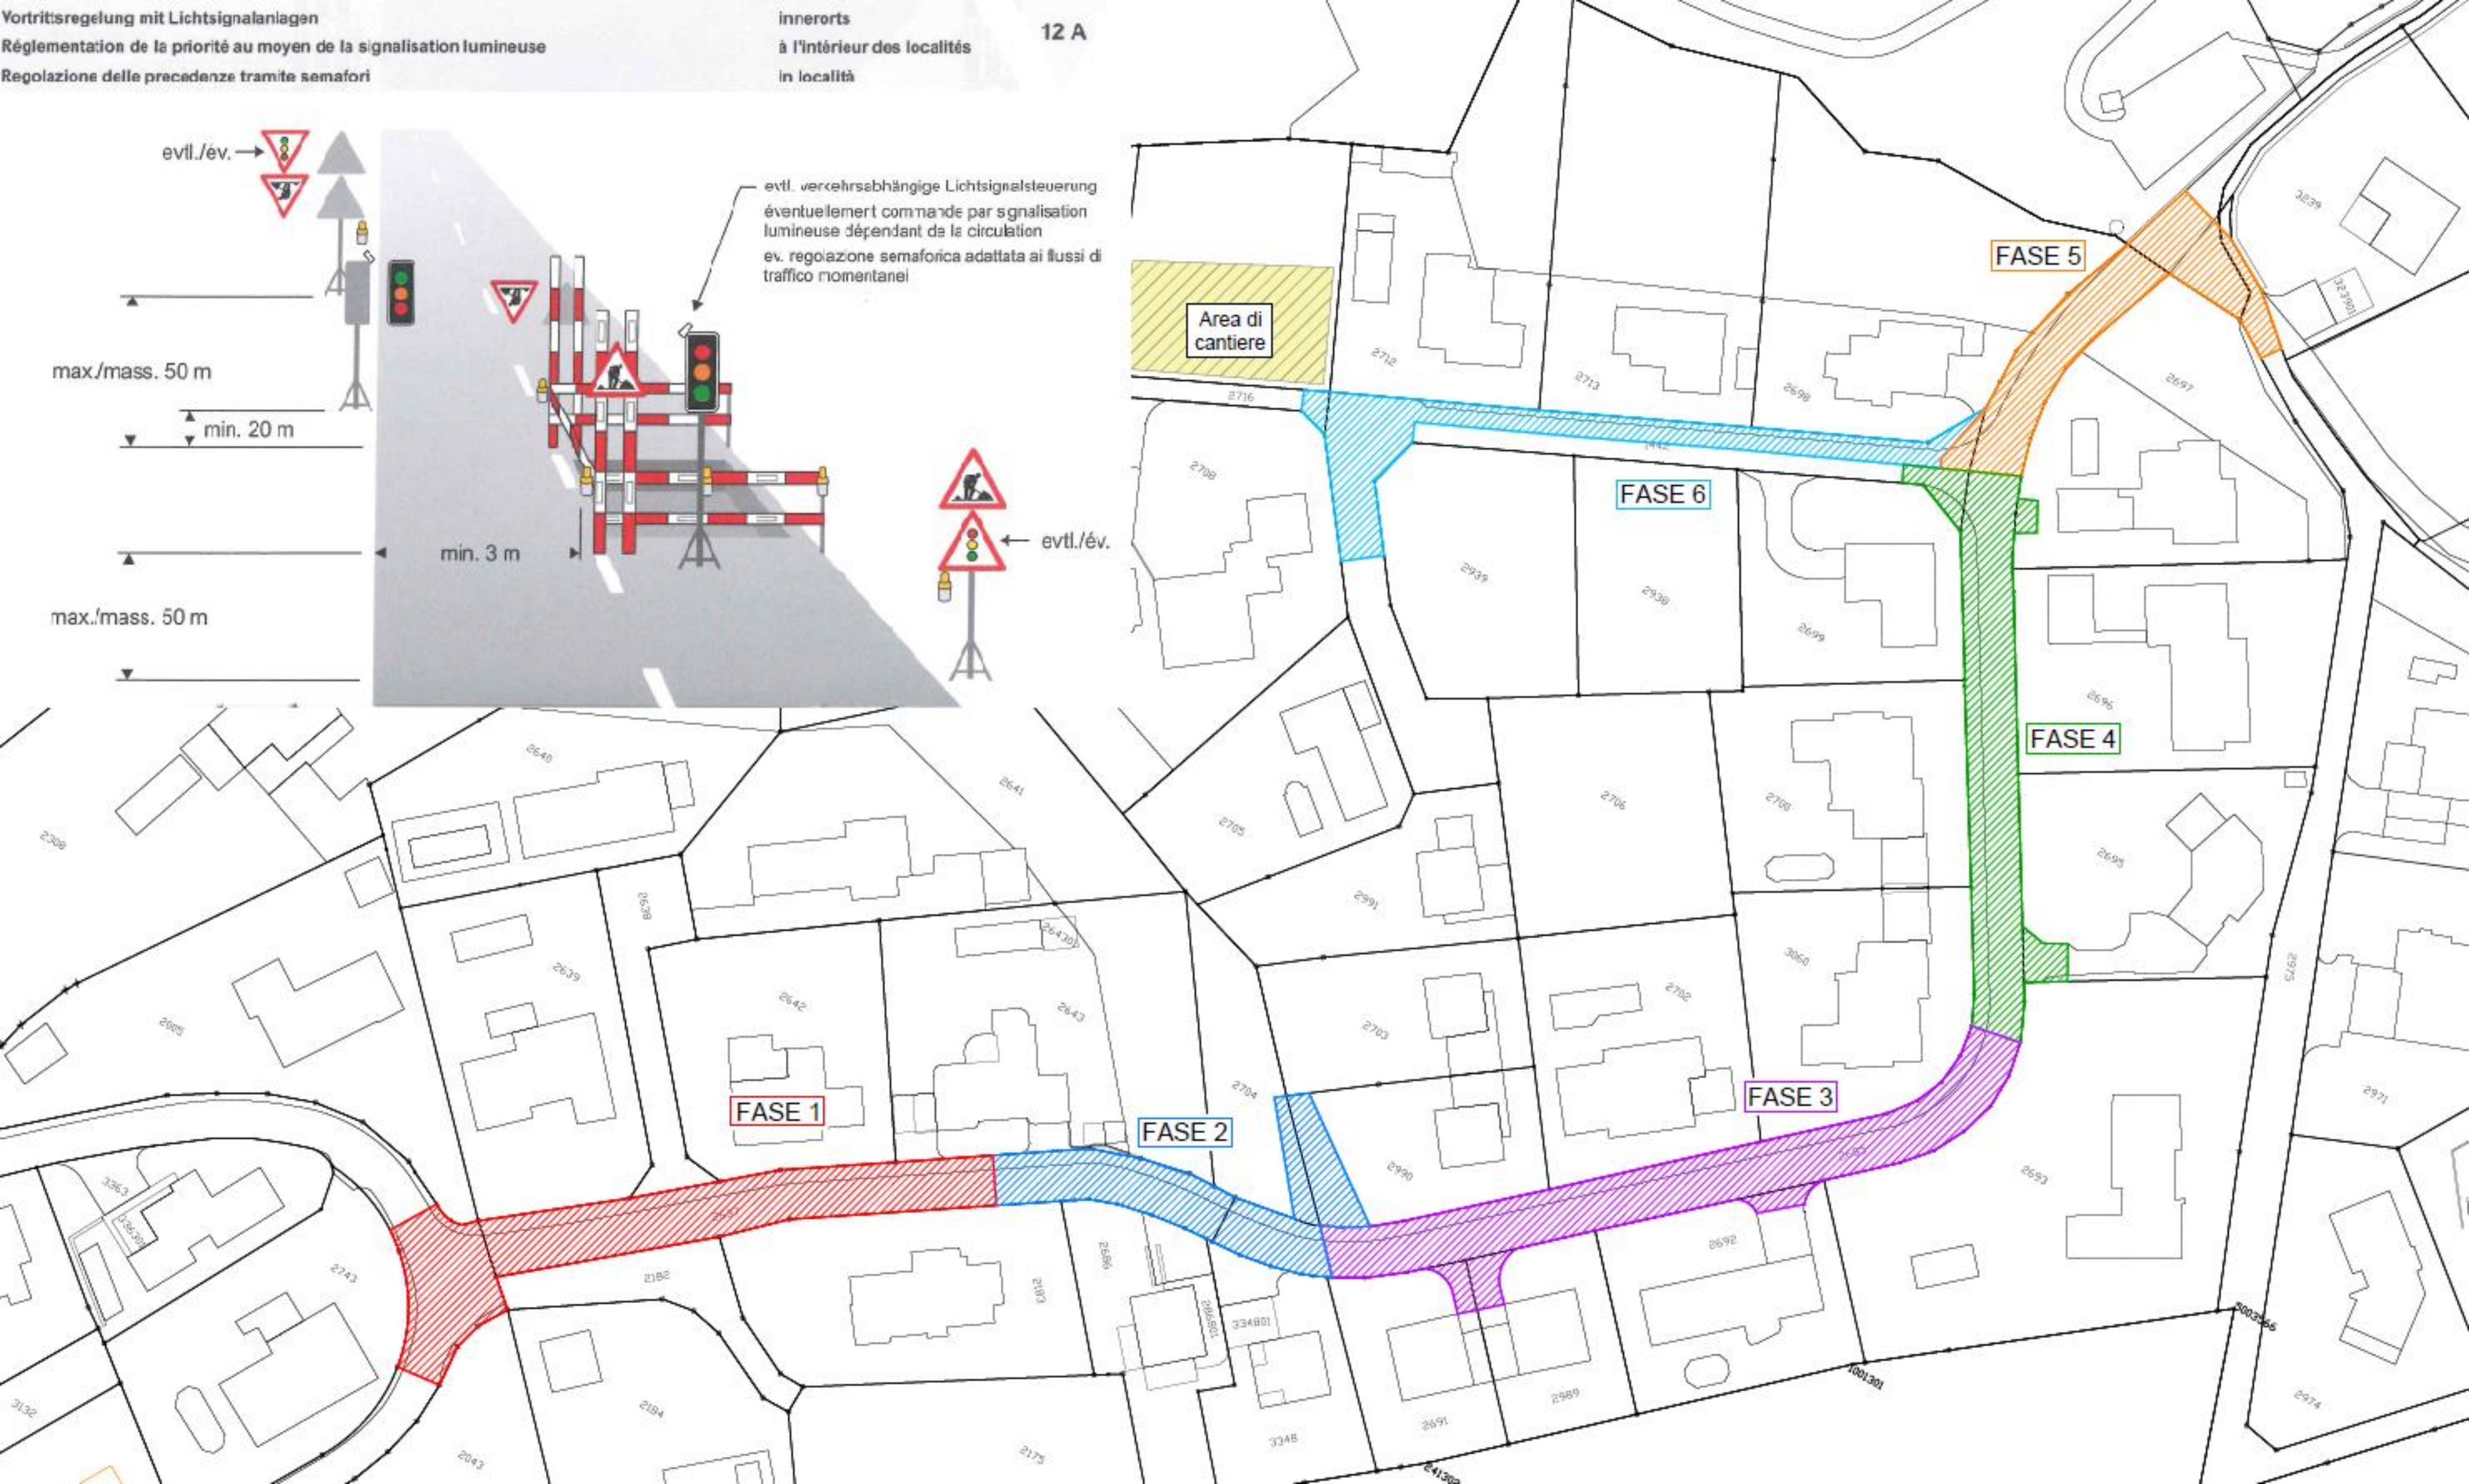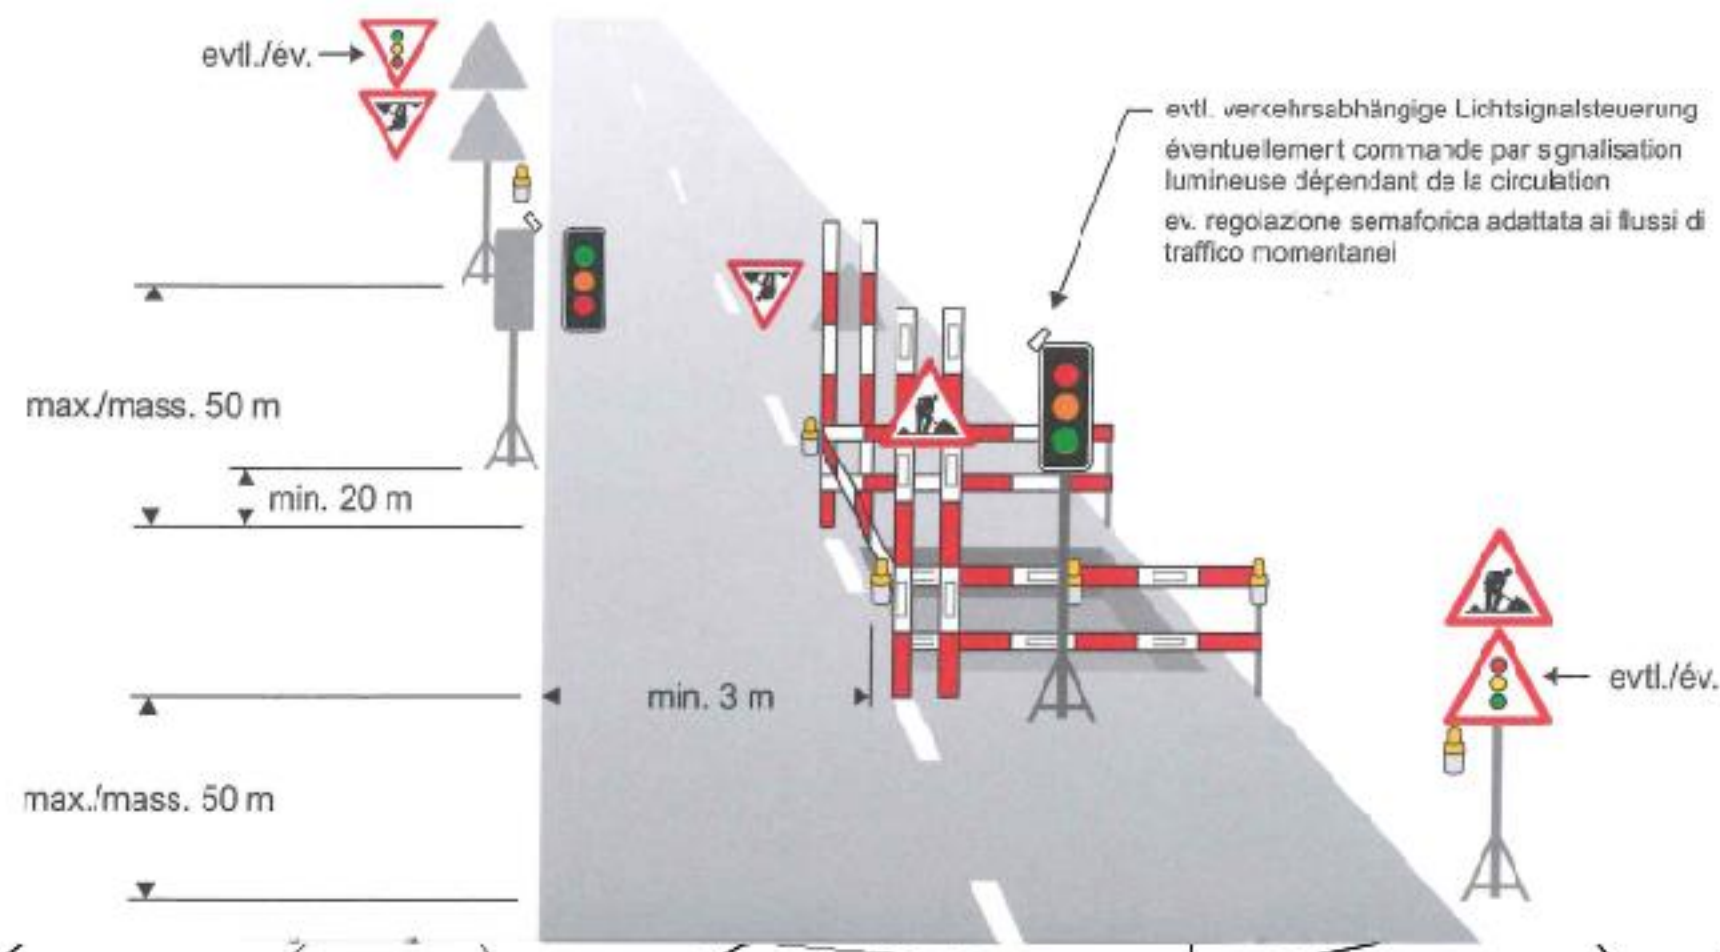

## Fasi di lavoro

Descrizione

**MENDRISIO - Via della Selva**

Opere da

**Impresario e Pavimentazione**

FASI	LAVORAZIONI	GIORNI LAVORATIVI ca.
Fase 1	SOTTOSTRUTTURA	35
	PAVIMENTAZIONE	15
Fase 2	SOTTOSTRUTTURA	40
	PAVIMENTAZIONE	15
Fase 3	SOTTOSTRUTTURA	45
	PAVIMENTAZIONE	15
Fase 4	SOTTOSTRUTTURA	35
	PAVIMENTAZIONE	15
Fase 5	SOTTOSTRUTTURA	15
	PAVIMENTAZIONE	10
Fase 6	SOTTOSTRUTTURA	10
	PAVIMENTAZIONE	10
<b>TOTALE GIORNI</b>		<b>260</b>

**INIZIO LAVORI PRESUNTO**
**PRIMAVERA 2025**
**FINE LAVORI PRESUNTO**
**ESTATE 2026**
